INFORME DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PUENTE DE PIEDRA DE CUZCURRITA, 2018.

EXPTE.003/2018 RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PUENTE DE PIEDRA DE CUZCURRITA EN LA CARRETERA LR-307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
Consejería de Fomento y Política Territorial
D.G. de Obras Públicas y Transportes.

Director de proyecto y director de obra: D. José Miguel Mateo Valerio I.C.C.P.

Ingeniero proyectista: D. Guillermo Capellán Miguel Dr. I.C.C.P. de Arenas y Asociados.

Empresa adjudicataria: Trabajos Especiales Zut S.A.

Asistencia técnica a la dirección de obra: D. Jorge López Tamames, I.C.C.P. de Teknes Innovación S.L.

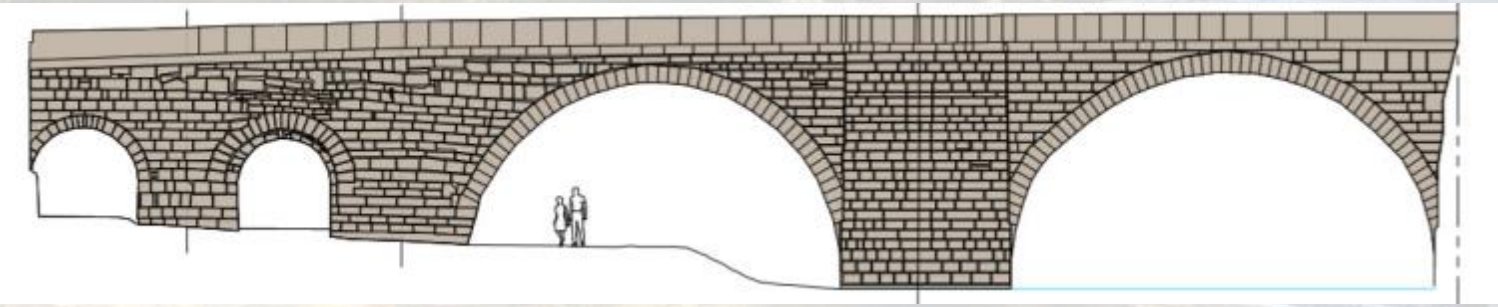

00	PRESUPUESTO DE CONTRATA 196.867,00 €			
Nº	DENOMINACION	UD	CANTIDADES	PROCEDIMINENTO DE EJECUCION.
01	ARQUEOLOGIA.	JORNADA	15	VISITA DE OBRA, TOMA DE DATOS Y REVISION DE ARCHIVOS, LECTURA DE PARAMENTOS
02	SANEADO Y LIMPIEZA.	M2	736,56	AGUA A PRESION, ARIDO SILICA ALUMINA CEPILLOS CEDRA NATURAL
03	REGENERACION ESTRUCTURAL.	M2	----------	----------
03.1.1	REJUNTADO FABRICA DE CANTERIA.	M2	736,56	RECIBIDO MANUAL DE MORTERO DE CAL HIDRAULICA
03.1.2	RECONSTRUCCION DE PIEZAS DE FABRICA DE CANTERIA.	M2	46,64	RETIRADA Y REPOSICION DE PIEZAS SUELTAS, FABRICAY TALLADO DE NUEVAS PIEZAS
03.2.1	ACTUACIONES REFUERZO ESTRUTURAL DE LAS BOVEDAS.	UD	60	COSIDO CON BARRAS CORRUGADAS DE FIBRA DE CARBONO
03.3.2	ACTUACIONES EN CIMENTACIONES.	M3	3.5	SANEADO ENCOFRADO Y VERTIDO DE HORMIGON EN BASE DE PILA CENTRAL.
04	DRENAJE.	VARIOS		ARREGLO DE GARGOLAS, PUESTA DERIGOLA DE HORMIGON CONEXIÓN CON ARQUETAS.
05	RENOVACION DE PAVIMENTO.	M2	259,94	FRESADO, REPICADO ZONAS DEBILES, HORMIGONADO, IMPERMEABILIZACION, RIEGO BITUMINOSO Y REASFLATADO CON CREACION DE CAIDAS.
06	ILUMINACIÓN.	P.A.		RETIRADA REPOSICION Y REPARACION DE ILUMINACION BAJO PUENTE Y FAROLA DE LA CARRETERA.
07	MEDIOS AUXILIARES.	M2	901,87	MONTAJE DESMONTAJE Y ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL EUROPEO
08	SEÑALIZACION Y BALIZAMINETO	VARIOS		VALLADO Y CIERRE DE OBRA, SEÑALIZACION DE CORTES DE CARRETERA EN CRUCES PROXIMOS, REPINTADO DE MARCAS VIALES Y CAMBIO DE SEÑALES VERTICALES EN CALZADA.
09	GESTION DE RESIDUOS.	P.A.		RECOGIDA DE RESIDUOS INERTES Y PELIGROSOS Y TRATAMIENTO POR GESTOR AUTORIZADO.
010	SEGURIDAD Y SALUD	P.A.		SEGÚN PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
011	ENSAYOS	P.A.		VARIAS CATAS Y MUESTREOS DE DIFERENTES PIEDRAS Y MORTEROS.

ESTADO INICIAL

SUPERFICIE COMPLETA ANDAMIADA

REPARACION DE PARAMENTOS DE CANTERIA

REPOSICION DE LOSETAS Y SILLARES DE CANTERIA

CONSOLIDACION DE ARCOS CON PERFORACION DE DIAMANTE Y ANCLAJES DE BARRA DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EPOXI

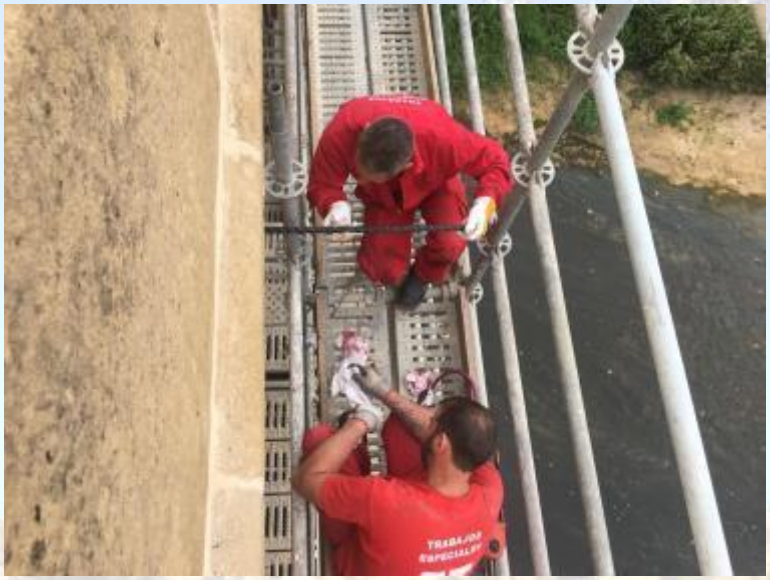

FRESADO, EXCAVACION DE PAVIMENTO Y HORMIGONADO.

RESTOS ARQUEOLÓGICOS, NUEVA RIGOLA.

LABORES DE RE ASFALTADO.

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.

RESTAURACION DE ILUMINACION.

REPARACION CON ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE LA ZONA SOCAVADA BAJO LOS ENCEPADOS DEL TAJAMAR DE LA PILA PRINCIPAL.

VISTA GENERAL AGUAS ABAJO.

VISTA GENERAL AGUAS ARRIBA.
